

女川原子力発電所の状況（平成26年4月分）

女川原子力発電所は1号機および3号機が通常運転中、2号機が原子炉起動中のところ、平成23年3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震により全号機の原子炉が設計どおり自動停止しました。

（平成23年3月11日お知らせ済み）

現在、設備の点検や各種安全対策等を実施しております。

女川原子力発電所の状況については、以下のとおりです。

1. 定期検査の実施状況

（1）女川原子力発電所1号機

女川原子力発電所1号機は、平成23年9月10日より第20回定期検査を実施しております。

（添付－1 女川原子力発電所1号機 第20回定期検査 主要点検工程表 参照）

（2）女川原子力発電所2号機

女川原子力発電所2号機は、平成22年11月6日より第11回定期検査を実施しております。

平成26年4月30日現在、主な作業として耐震工事等を行っております。

（添付－2 女川原子力発電所2号機 第11回定期検査 主要点検工程表 参照）

（3）女川原子力発電所3号機

女川原子力発電所3号機は、平成23年9月10日より第7回定期検査を実施しております。

平成26年4月30日現在、主な作業として蒸気タービンの点検、復水器細管の点検およびプラント停止中の安全維持点検等を行っております。

（添付－3 女川原子力発電所3号機 第7回定期検査 主要点検工程表 参照）

a. 主要機器の点検状況

主な機器の点検状況は以下のとおりです。

(a) プラント停止中の安全維持点検

原子炉停止中においてもプラントの安全性を維持するために必要な系統について、点検を実施しております。

(b) 復水器細管の点検

約27,000本ある復水器細管全数について点検を行っております。

(4) 定期検査に係るトラブルに該当しないひび、傷等の状況について

a. 平成26年4月の主要機器の点検状況は、以下のとおりです。

(a) 1号機

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象として1件が確認されております※。(詳細については、添付－4参照)

※1、2、3号機共用建屋における軽度な事象であることから、代表して1号機に記載

(b) 2号機

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。

(c) 3号機

トラブルに該当しない「ひび」、「傷」等の軽度な事象はありませんでした。

b. 既報告の主要機器の点検で、4月中に補修等の作業が終了したものは下表のとおりです。

(詳細については、添付－5参照)

報告時期、報告 No.	件 名	作業終了日	備 考
平成26年2月分 No. 1 (改)	非常用ディーゼル発電機 (B) シリンダライナ外側冷却水 通路への混入物について	平成26年 4月15日	添付－5

2. 地震および津波による発電所主要設備への軽微な被害の対応状況

主要設備への軽微な被害として、これまでにお知らせしていた61件から新たな追加はありません。

(添付－6 東北地方太平洋沖地震後の主要設備への軽微な被害状況リスト 参照)

3. その他

(1) 女川原子力発電所2号機におけるガムの発見について

平成26年4月23日、女川原子力発電所2号機の管理区域内において、ごみ箱から計15個のガムを発見しました。

管理区域内での飲食・喫煙防止活動については、これまでも放射線防護テキストの見直し、管理区域入口付近へのポスター掲示、管理区域入口付近での持ち込み物品(ポケット内含む)の抜き取り確認、および立哨・声掛け等の活動を実施しておりますが、今後も継続して管理区域内の飲食・喫煙防止に努めるとともに、更なる再発防止対策について検討してまいります。

以 上

1号機 第20回定期検査 主要点検工程表

年 月	平成25年6月																														平成25年7月																															平成25年8月																														
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																															
延 日	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722
主 要 工 程	安全維持点検																																																																																											
																															冷温停止																																																													
原 子 炉 本 体																																																																																												
原 子 炉 格 納 施 設																																																																																												
燃 料 設 備																																																																																												
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備																																																																																												
計 測 制 御 系 統 設 備	主要計測機器および一般計測機器点検																																																																																											
放 射 線 管 理 設 備																																																																																												
廃 棄 設 備																																																																																												
非 常 用 予 備 発 電 装 置																																																																																												
蒸 気 タ ー ビ ン 設 備																																																																																												
電 気 設 備																																																																																												
供 用 期 間 中 検 査																																																																																												
そ の 他																																																																																												

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前のお知らせ参照

女川原子力発電所2号機 第11回定期検査 主要点検工程表

[illegible]

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前のお知らせ参照

[illegible]

年 月	平成25年11月																														平成25年12月																														平成26年1月																															
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																															
延 日	1092	1093	1094	1096	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183
主 要 工 程																																																													タービン建屋補助クレーン制御盤更新工事																															
	蒸気タービン点検																																																																																											
																															安全維持点検																																																													
原 子 炉 本 体																																																																																												
原 子 炉 格 納 施 設																																																																																												
燃 料 設 備																																																																																												
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備																															原子炉再循環ポンプ分解点検																																																													
計 測 制 御 系 統 設 備																															主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																													
																															主要計測機器および一般計測機器点検																																																													
放 射 線 管 理 設 備																															エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																													
廃 棄 設 備																															液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																													
非 常 用 予 備 発 電 装 置																															非常用予備発電装置点検																																																													
蒸 気 ター ビ ン 設 備																															蒸気タービンおよび復水器点検																																																													
電 気 設 備																															主変圧器および起動変圧器点検																																																													
供 用 期 間 中 検 査																																																																																												
そ の 他																															耐震工事																																																													

女川原子力発電所3号機 第7回定期検査 主要点検工程表

年 月 日	平成25年6月																														平成25年7月																														平成25年8月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														
延 日	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722
主 要 工 程	蒸気タービン点検																																																																																											
原 子 炉 本 体 原 子 炉 格 納 施 設																																																																																												
燃 料 設 備																																																																																												
原 子 炉 冷 却 系 統 設 備	主蒸気隔離弁点検																																																																																											
	主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																																																											
計 測 制 御 系 統 設 備	主要計測機器および一般計測機器点検																																																																																											
放 射 線 管 理 設 備	エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																																																											
廃 棄 設 備	液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																																											
非 常 用 予 備 発 電 装 置	非常用予備発電装置点検																																																																																											
蒸 気 ター ビ ン 設 備	蒸気タービンおよび復水器点検																																																																																											
電 気 設 備	発電機および変圧器点検																																																																																											
供 用 期 間 中 検 査	クラス1機器供用期間中検査																																																																																											
そ の 他	耐震工事																																																																																											

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前のお知らせ参照

[illegible]

[illegible]

女川原子力発電所 1 号機 主要機器点検情報（平成 26 年 4 月分）

設備名	設備区分	実施内容	検査区分	概要
サイトバンカ貯蔵プール	△	－	－	・ サイトバンカ建屋の定例巡視において、サイトバンカ貯蔵プールの固体廃棄物移送容器ピット側の漏えい検出配管出口より水が滴下していることを発見しました。（4 月 4 日） ・ その後、監視を継続していたところ、サイトバンカ貯蔵プールの減容ピット側の漏えい検出配管出口からも水が滴下していることを確認しました。（4 月 15 日） ・ 滴下水がプール水であるかを確認するため、4 月 28 日にプール内へ蛍光染料を投入し、漏えい検出配管からの滴下水の分析を行った結果、滴下水より蛍光染料が検出されたことから、滴下水はプール水であると判断しました。（5 月 1 日） ・ 今後、流出箇所の特定制および原因調査を進めてまいります。 ・ 滴下量は、1 日あたり 2～3 リットル程度であり、固体廃棄物の水中貯蔵保管に支障はありません。 ・ また、滴下水は、ドレンサンプピット内に回収されており、外部への放射能の影響はありません。 （詳細については、個別情報 No. 1 参照）


- 【設備区分】 ○：安全上重要な設備（原子炉圧力バウンダリ、原子炉本体、非常用炉心冷却系等）
△：それ以外の設備
- 【検査区分】 定：法令に基づき国または独立行政法人原子力安全基盤機構が実施する定期検査
事：法令に基づき当社が実施する定期事業者検査
点：保守管理に基づく点検・補修等




女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報

No. 1

(平成26年4月分)

号	機	1、2、3号共用		定 期 検 査	—	
件	名	サイトバンカ貯蔵プール漏えい検出配管からの水の滴下				
月	日	平成26年4月4日（金）			発 生	発 見 確 認
場	所	サイトバンカ 建屋	設 備	サイトバンカ貯蔵 プール	設備区分	それ以外の系統
設備概要		サイトバンカ貯蔵プールは、女川原子力発電所で発生する放射性固体廃棄物（使用済チャンネルボックス、使用済制御棒等）を水中に貯蔵保管する設備であり、サイトバンカ建屋内に設置している。				
所 見		・ サイトバンカ建屋の定例巡視において、サイトバンカ貯蔵プールの固体廃棄物移送容器ピット側の漏えい検出配管出口より水が滴下していることを発見しました。（4月4日） ・ その後、監視を継続していたところ、サイトバンカ貯蔵プールの減容ピット側の漏えい検出配管出口からも水が滴下していることを確認しました。（4月15日） ・ 滴下水がプール水であるかを確認するため、4月28日にプール内へ蛍光染料を投入し、漏えい検出配管からの滴下水の分析を行った結果、滴下水より蛍光染料が検出されたことから、滴下水はプール水であると判断しました。（5月1日） ・ 今後、流出箇所の特定制および原因調査を進めてまいります。 ・ 滴下量は、1日あたり2～3リットル程度であり、固体廃棄物の水中貯蔵保管に支障はありません。 ・ また、滴下水は、ドレンサンプピット内に回収されており、外部への放射能の影響はありません。				

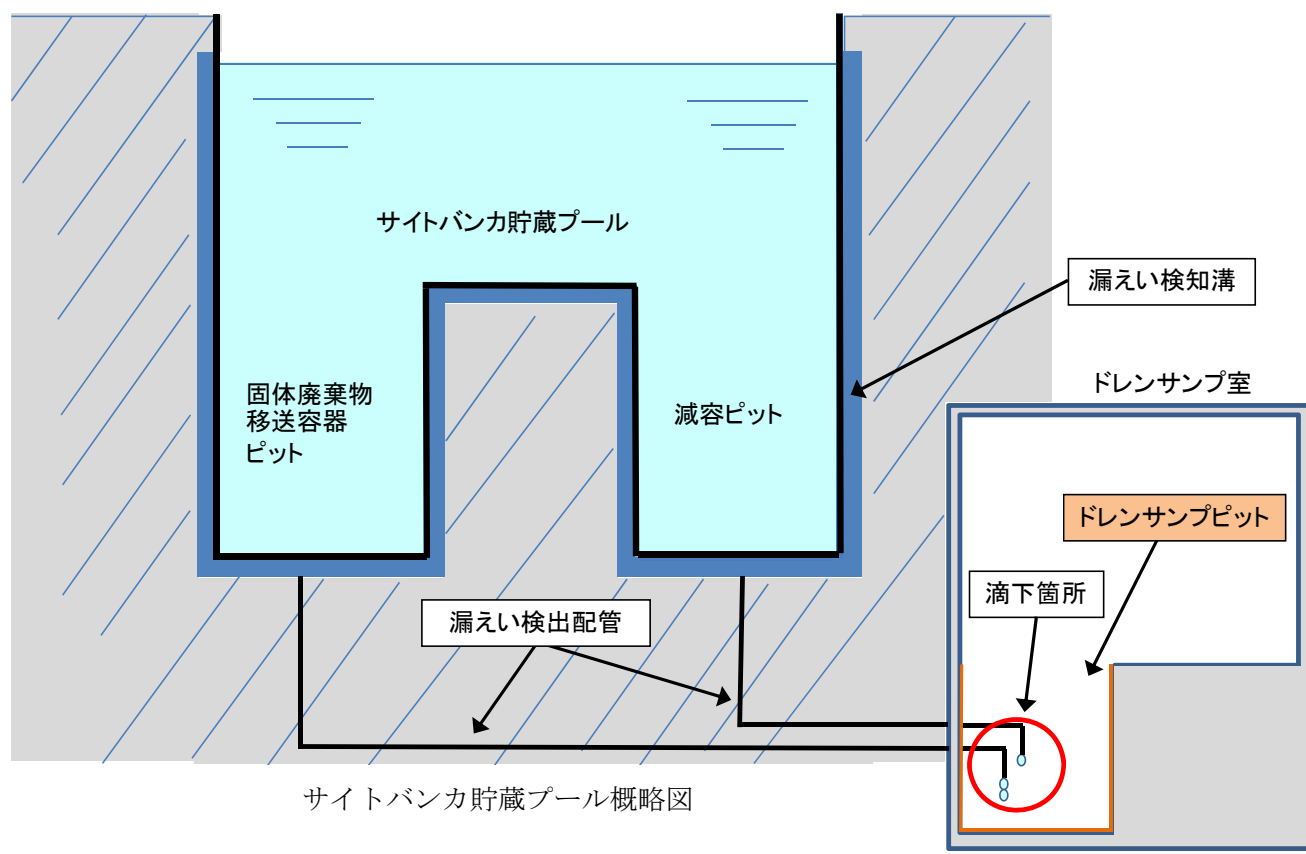

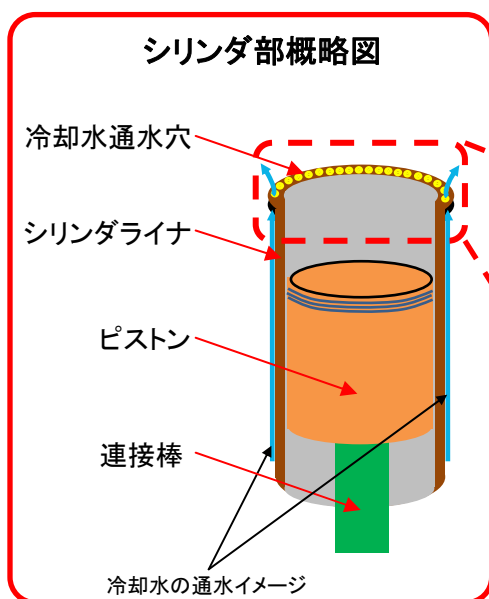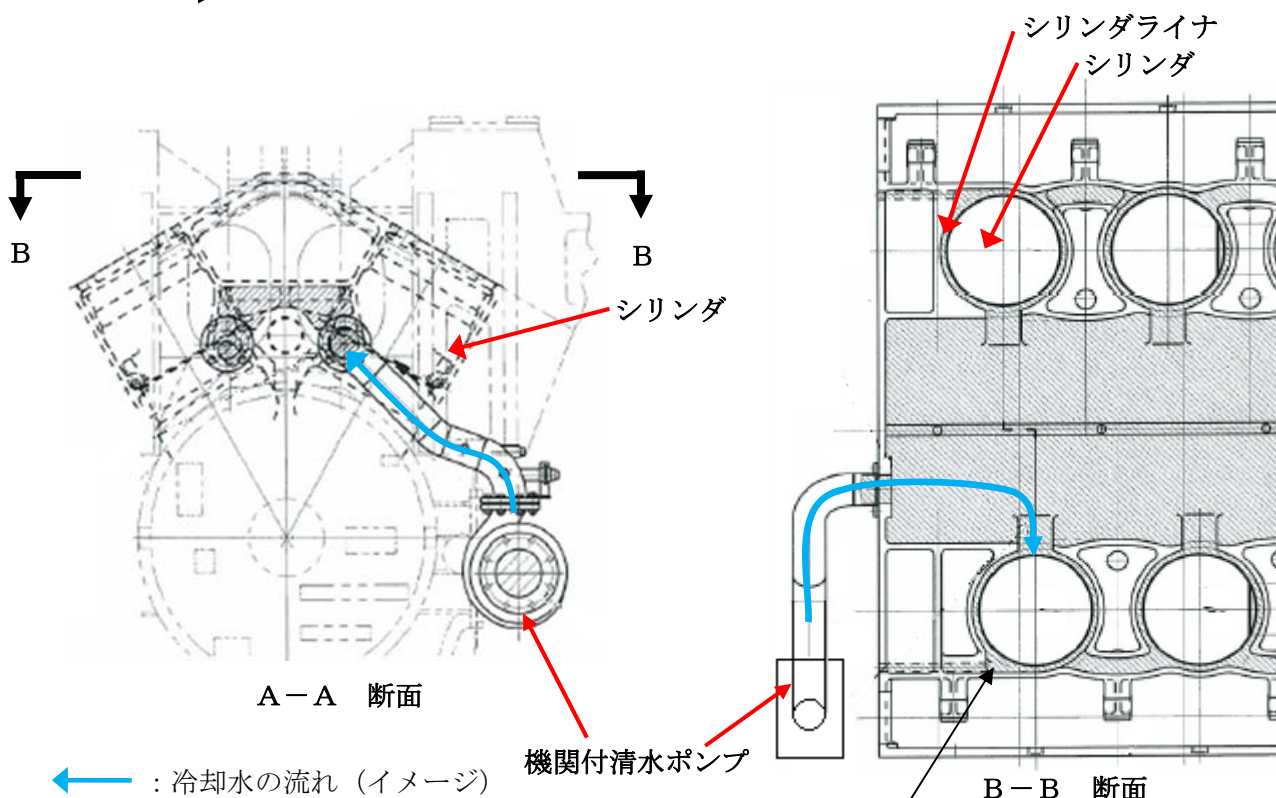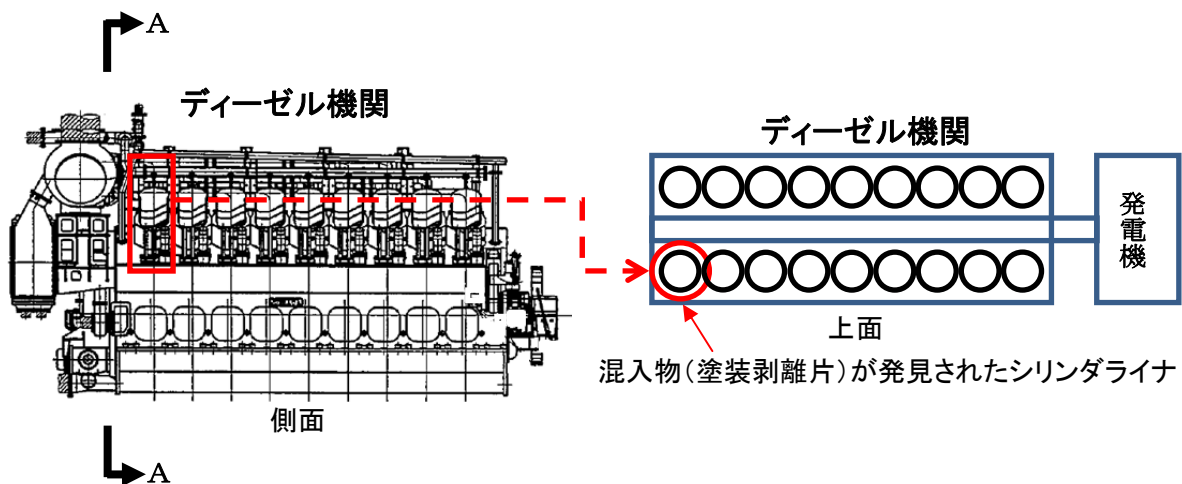

東北地方太平洋沖地震後の主要設備への軽微な被害状況リスト※

○平成23年5月分

No.	号機	建屋	管理区域	件名	対応状況
1	1号機	原子炉建屋	内	燃料交換機入出力装置の破損	対応済(H24. 2)
2	1号機	原子炉建屋	内	ほう酸水貯蔵タンク水位指示回路不良	対応済(H23. 12)
3	1号機	原子炉建屋	内	主蒸気逃がし安全弁(C) 位置検出スイッチの接点不良	対応済(H23. 12)
4	1号機	原子炉建屋	内	制御棒駆動系ハウジング支持金具サポートバーのずれ	対応済(H24. 6)
5	1号機	原子炉建屋	内	原子炉格納容器内遮へい扉 留め具の外れ	対応済(H24. 3)
6	1号機	原子炉建屋	内	天井クレーン運転席鋼材等の損傷	対応済(H23. 9)
7,8	1号機	制御建屋	外	125V直流電源系の地絡(計2件発見)	対応済(H24. 2)
9	1号機	制御建屋	外	モニタリングポスト(チャンネル6) 信号変換器の故障に伴う指示不良	対応済(H23. 10)
10	1号機	タービン建屋	内	高圧電源盤しゃ断器の投入不可	対応済(H23. 6)
11	1号機	タービン建屋	内	母連しゃ断器の制御電源喪失	対応済(H23. 6)
12～ 15	1号機	屋外	外	変圧器避圧弁の油面変動に伴う動作(計4件)	対応済(H23. 6)
16	1号機	屋外	外	1号機放水口モニターの津波による浸水および破損	対応済(H24. 10)
17	1号機	屋外	外	1号機放水口モニター(試験運用機)の津波による浸水および破損	対応済(H24. 10)
18,19	2号機	原子炉建屋	内	地下1階電動ステップバック遮へい扉の施錠装置の破損(計2件発見)	対応済(H23. 10)
20	2号機	原子炉建屋	内	原子炉格納容器内遮へい扉 留め具の変形	対応済(H24. 2)
21	2号機	原子炉建屋	内	制御棒駆動系ハウジング支持金具サポートバーのずれ	対応済(H24. 6)
22	2号機	原子炉建屋	内	天井クレーン運転席鋼材等の損傷	対応済(H23. 6)
23,24	2号機	制御建屋	外	125V直流主母線盤の地絡(計2件発見)	対応済(H24. 3)
25	2号機	タービン建屋	内	蒸気タービン中間軸受箱の基礎の損傷	対応済(H24. 12)
26～ 32	2号機	屋外	外	変圧器避圧弁の油面変動に伴う動作(計7件発見)	対応済(H23. 11)
33	2号機	屋外	外	2号機放水口モニターの津波による浸水および破損	対応済(H24. 10)
34	2号機	屋外	外	起動用変圧器放熱器油漏れ	対応済(H24. 1)
35	3号機	原子炉建屋	内	燃料交換機の配線ケーブルの脱線	対応済(H23. 4)
36	3号機	原子炉建屋	内	燃料交換機制御室内の地上操作装置落下	対応済(H23. 6)
37	3号機	原子炉建屋	内	燃料取替エリア放射線モニタ(A) 記録計の指示不良	対応済(H23. 8)
38	3号機	原子炉建屋	内	原子炉格納容器内遮へい扉 留め具の変形	対応済(H24. 2)
39	3号機	原子炉建屋	内	使用済燃料プールにおけるゲート押さえ金具の脱落	対応済(H23. 4)
40	3号機	原子炉建屋	内	使用済燃料キャスクピットにおけるゲート押さえ金具の脱落	対応済(H23. 4)
41	3号機	原子炉建屋	内	高圧炉心スプレイ系圧力抑制室吸込弁 自動での全開動作不能	対応済(H23. 6)
42	3号機	原子炉建屋	内	制御棒駆動系ハウジング支持金具サポートバーのずれ	対応済(H24. 6)
43	3号機	原子炉建屋	内	天井クレーン走行部等のすり傷	対応済(H23. 6)
44～ 47	3号機	原子炉建屋	外	125V直流主母線盤の地絡(計4件発見)	対応済(H24. 2)
48	3号機	タービン建屋	内	蒸気タービン中間軸受箱の浮き上がりについて	対応済(H24. 4)
49～ 51	3号機	屋外	外	変圧器避圧弁の油面変動に伴う動作(計3件)	対応済(H23. 8)
52	3号機	屋外	外	3号機放水口モニターの津波による浸水および破損	対応済(H24. 8)
53	共用	屋外	外	牡鹿幹線1号線避雷器の損傷	対応済(H23. 6) 続報(H23. 8)
54	共用	屋外	外	当社モニタリングステーション(4局)の停電および伝送回線停止に伴う欠測	対応済(H23. 10)
55	共用	屋外	外	海水温度モニタリング装置の津波による破損に伴う全局欠測	対応済(H24. 6)

○平成23年6月分

No.	号機	建屋	管理区域	件名	対応状況
56	3号機	タービン建屋	内	3号機蒸気タービン動翼の損傷	

○平成23年7月分

No.	号機	建屋	管理区域	件名	対応状況
57	2号機	タービン建屋	内	2号機蒸気タービン動翼の損傷	対応済(H25. 4)

○平成23年8月分

No.	号機	建屋	管理区域	件名	対応状況
58	共用	屋外	外	牡鹿幹線2号線避雷器の損傷	対応済(H23. 8)

○平成23年9月分

No.	号機	建屋	管理区域	件名	対応状況
59	2号機	タービン建屋	外	2号機タービン建屋外壁のひび割れ	

○平成23年10月分

No.	号機	建屋	管理区域	件名	対応状況
60	共用	固体廃棄物 貯蔵所	内	固体廃棄物貯蔵所コンクリート壁の剥離	対応済(H25. 8)

○平成23年11月分

No.	号機	建屋	管理区域	件名	対応状況
61	2号機	タービン建屋	内	2号機蒸気タービン中間軸受箱の基礎ボルト曲がり	対応済(H24. 12)

※ 3. 11地震およびその余震による被害
