# 当社原子力発電所におけるケーブルの不適切な敷設事例


# 《中央制御室の床下》

## 【事例①】分離板が適切に設置されていなかった事例

[本来の状態] 分離板は損傷等がなく適切な位置に設置されている

[今回の事例] 安全系ケーブルへの火災時の延焼を防護する分離板が、未設置、撤去、損傷等がある状態のため、隣接する区分間の火災防護上の分離がなされていない

### 【東通1号機の事例】

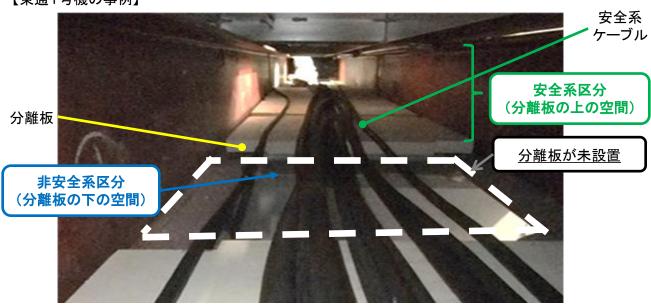

# 【事例②】非安全系ケーブルが複数の安全系区分に跨いで敷設されていた事例

「本来の状態」非安全系ケーブルは非安全系区分に敷設されている

[今回の事例] 非安全系ケーブルが複数の安全系区分に跨いで敷設されている状態のため、安全系区分間の火災防護上の分離がなされていない

# 安全系区分 I 安全系区分 I の左隣) 非安全系区分 (安全系区分 I の右隣) 非安全系 アーブルが分離板を貫通し、 安全系区分 I および同区分 I を跨いでいる状態

# 《現場ケーブルトレイ(中央制御室の床下以外)》

## 【事例③】非安全系ケーブルが複数の安全系区分に跨いで敷設されていた事例

[本来の状態] 非安全系ケーブルは非安全系区分に敷設されている

[今回の事例] 非安全系ケーブルが複数の安全系区分に跨いで敷設されている状態のため、安全系区分間の火災防護上の分離がなされていない

### 【女川1号機の事例】

