

東北地方太平洋沖地震への当社の対応について

1. 当社管内各県の停電の状況(15日7時現在)

	地域	現在停電戸数(戸)	延べ停電戸数(戸)
青森県	三八の一部地域	2,016	916,964
岩手県	一部地域	114,893	807,572
秋田県	—	[12日 22:19復旧] 0	669,414
宮城県	ほぼ全域	629,831	1,545,299
山形県	—	[12日 21:13復旧] 0	529,774
福島県	浜通りの一部地域	46,548	370,152
新潟県	—	[12日 15:51復旧] 0	1,313*
合計		793,288	4,840,488

(上記停電戸数は今後の調査により変動する可能性があります)


※新潟県で発生した停電は、12日3時59分に発生した新潟県中越地方を震源とする地震の影響によるものです。

2. 復旧体制について

	人数	電源車(台)
当社関係	5,930名	127台
他電力からの応援	741名	41台
合計	6,671名	168台

※復旧作業の様子は添付写真のとおり

3. 停電戸数の推移について

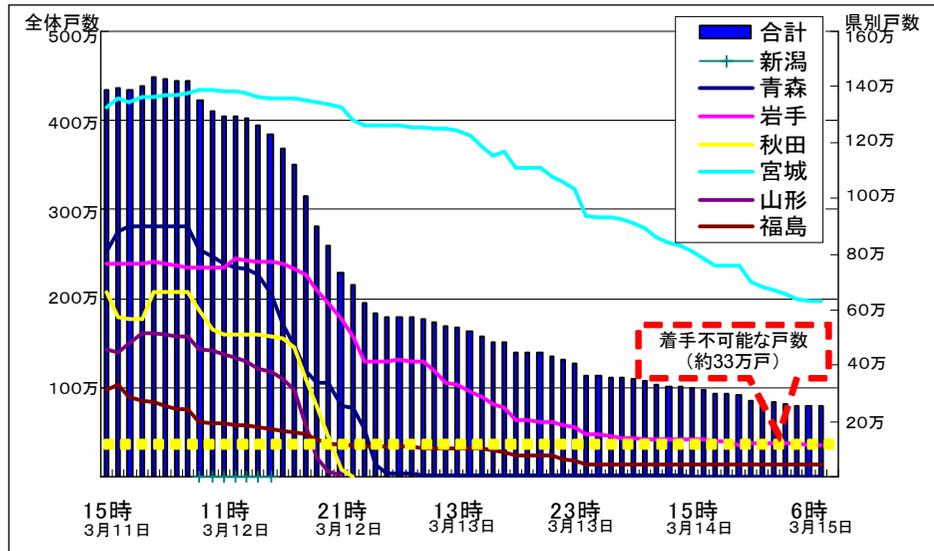

4. 今後の停電復旧の見通しについて

14日24時現在の停止状況に基づく復旧の見通しは、添付資料のとおり。

5. 当社発電所・設備の被害状況について

太平洋側の火力発電所などが甚大な被害を受けており、復旧には長時間を要する見込み。設備被害の様子は添付写真のとおり。

<原子力発電所>

・女川原子力発電所

1、2、3号機とも自動停止。その後冷温停止し、現在安定した状態となっている。

・東通原子力発電所

定期検査中のため、停止中。(定期検査は6月終了を予定)

<火力発電所>

八戸火力発電所	タービン建屋1階浸水 [浸水解消]、循環水ポンプ設置箇所他水没 [排水完了]、重油受入設備の液状化による基礎陥没 他
仙台火力発電所	開閉所およびタービン建屋1階浸水・土砂堆積 [浸水解消]
新仙台火力発電所	タービン建屋1階浸水。隣接製油所の火災により構内業者含め全員避難
原町火力発電所	事務本館1階浸水 [浸水解消]、揚炭機4台倒壊など屋外設備の被害発生、倒壊した重油タンク付近から火災発生

<水力発電設備>

設備被害・8ヵ所(建物内落石、土砂流入2ヵ所 他)

<変電設備>

設備被害・38ヵ所(変圧器損傷29台、遮断器損傷3台、断路器損傷27台 他)

<送電設備>

設備被害・68線路(鉄塔損壊・折損・傾斜40基、電線断線・がいし折損11ヵ所、地すべり5ヵ所 他)

<配電設備>

支持物折損・傾斜等 830基
電線断混線 3,222条間
変圧器・開閉器損傷等 812ヵ所 他
